

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THÔNG NHẤT CÁC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 06 tháng 2 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã An Châu:

- Ông (bà): Nguyễn Huỳnh Trình Chức vụ: P. Chủ tịch

- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Diễn Châu - Công ty Điện lực

Nghệ An:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thắng Chức vụ: Đội Phó

- Ông (bà): Chức vụ:

3. Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P. Giám Đốc

- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: ĐT Thiết kế

- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

Tại Đội quản lý Điện lực khu vực Diễn Châu tiến hành cải tạo các tuyến đường dây trên không 22kV để nâng cao khoảng cách pha đất đảm bảo vận hành an toàn:

1. Từ cột 1 NR Thọ Lợi đến cột 45 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

2. Cột 45 NR Thọ Lợi - Cột 6 NR Diễn Lợi 4 (ĐZ 477E15.13)

3. Cột 1 NR Diễn Thắng - Cột 28 NR Diễn Thắng (ĐZ 479E15.13)

4. Cột 28 NR Diễn Thắng - Cột 6 NR Diễn Thắng 4 (ĐZ 479E15.13)

5. Xử lý hành lang tuyến từ cột 47 đến cột 50 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

- Lắp đặt bổ sung 02 LBS 24kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ;
Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC

Trong đó đoạn tuyến đi qua xã An Châu cụ thể như sau:

I. Thuộc NR Thọ Lợi ĐZ ĐZ 477E15.13

- Điểm đầu: Cột 1 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

- Điểm cuối: Cột 8 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

- Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt LBS: Cột 24A TC ĐZ 477E15.13 (Dắm mới)

- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 22kV hiện có đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc theo đường nội đồng thuộc địa phận xã An Châu. Khi tiến hành cải tạo đường dây, cần thay thế một số vị trí cột đã cũ, thấp hoặc dặm thêm các vị trí xen giắc mới nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời thay thế một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.


UBND XÃ AN CHÂU

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huỳnh Trùng

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC


ĐIỆN CHÂU

Nguyễn Văn Thăng

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN




Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT CÁC TUYẾN

ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 23 tháng 1 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Tân Châu:

- Ông (bà): Phan Văn Hùng Chức vụ: P. Chủ Trì

- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Diễn Châu - Công ty Điện lực

Nghệ An:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thắng Chức vụ: Đội Phó

- Ông (bà): Chức vụ:

3. . Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P.Giám Đốc

- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: DT Thiết kế

- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

Tại Đội quản lý Điện lực khu vực Diễn Châu tiến hành cải tạo các tuyến đường dây trên không 22kV để nâng cao khoảng cách pha đất đảm bảo vận hành an toàn:

1. Từ cột 1 NR Thọ Lợi đến cột 45 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

2. Cột 45 NR Thọ Lợi - Cột 6 NR Diễn Lợi 4 (ĐZ 477E15.13)

3. Cột 1 NR Diễn Thắng - Cột 28 NR Diễn Thắng (ĐZ 479E15.13)

4. Cột 28 NR Diễn Thắng - Cột 6 NR Diễn Thắng 4 (ĐZ 479E15.13)

5. Xử lý hành lang tuyến từ cột 47 đến cột 50 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

- Lắp đặt bổ sung 02 LBS 24kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ;
Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC

Trong đó đoạn tuyến đi qua xã Tân Châu cụ thể như sau:

I. Thuộc NR Thọ Lợi ĐZ ĐZ 477E15.13

- Điểm đầu: Cột 9 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)
- Điểm cuối: Cột 45 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

II. Thuộc NR Thọ Lợi 4 ĐZ ĐZ 477E15.13

- Điểm đầu: Cột 45 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)
- Điểm cuối: Cột 6 NR Diễn Lợi 4 (ĐZ 477E15.13)
- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không và cáp ngầm 22kV hiện có chủ yếu đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc theo đường giao thông, đường nội đồng, một số đoạn tuyến vượt qua khu dân cư và các đường giao thông thuộc địa phận xã Tân Châu, tỉnh Nghệ an. Khi tiến hành cải tạo đường dây, cần thay thế một số vị trí cột đã cũ, thấp hoặc dắm thêm các vị trí xen giảm mới nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời thay thế một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

Trong đó có một số đoạn tuyến đi qua khu vực dân cư cần xử lý nắn tuyến để đảm bảo vận hành hành lang lưới điện an toàn. Cụ thể như sau:

+ Đoạn tuyến đường dây trung thế 22kV trên không hiện có từ cột 20 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) đến cột 26 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) có 1 số đoạn tuyến đang đi qua khu dân cư. Để xử lý đoạn tuyến nêu trên, tiến hành xây dựng mới đoạn tuyến đường dây 22kV trên không, thay thế và dắm thêm các vị trí mới để nắn tuyến xử lý hành lang nhằm đảm bảo vận hành an toàn lâu dài.

+ Đoạn tuyến đường dây trung thế 22kV trên không hiện có từ cột 32 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) đến cột 38 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) có 1 số đoạn tuyến đang đi qua khu dân cư. Để xử lý đoạn tuyến nêu trên, tiến hành xây dựng mới đoạn tuyến đường dây 22kV trên không, thay thế và dắm thêm các vị trí mới để nắn tuyến xử lý hành lang nhằm đảm bảo vận hành an toàn lâu dài.

+ Đoạn tuyến đường dây trung thế 22kV cáp ngầm hiện có từ cột 38 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) đến cột 39 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) hiện đang sử dụng tiết

diện dây cáp ngầm CU với tiết diện 120mm. Tiến hành thay thế đoạn tuyến cáp ngầm trên bằng cáp ngầm có tiết diện lớn hơn nhằm đảm bảo vận hành an toàn lâu dài.

+ Đoạn tuyến đường dây trung thế 22kV trên không hiện có từ cột 47 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) đến cột 50 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13) đoạn tuyến đang đi qua khu dân cư. Để xử lý đoạn tuyến nêu trên, tiến hành xây dựng mới đoạn tuyến đường dây cáp ngầm 22kV thay thế để xử lý hành lang nhằm đảm bảo vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ TÂN CHÂU



Phan Văn Hùng

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU
VỰC ĐIỆN CHÂU



Nguyễn Văn Thắng

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT CÁC TUYẾN ĐƯỜNG

DÂY TRUNG ÁP CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP

Dự án : "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 06 tháng 02 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Minh Châu:

- Ông (bà): Lê Mạnh Hiền Chức vụ: Chủ tịch
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Diễn Châu - Công ty Điện lực Nghệ An:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thống Chức vụ: Đội Phó
- Ông (bà): Chức vụ:

3. Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P.Giám Đốc
- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: ĐT Thiết kế
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập. Tại Đội quản lý Điện lực khu vực Diễn Châu tiến hành cải tạo các tuyến đường dây trên không 22kV để nâng cao khoảng cách pha đất đảm bảo vận hành an toàn:

1. Từ cột 1 NR Thọ Lợi đến cột 45 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)
2. Cột 45 NR Thọ Lợi - Cột 6 NR Diễn Lợi 4 (ĐZ 477E15.13)
3. Cột 1 NR Diễn Thắng - Cột 28 NR Diễn Thắng (ĐZ 479E15.13)
4. Cột 28 NR Diễn Thắng - Cột 6 NR Diễn Thắng 4 (ĐZ 479E15.13)
5. Xử lý hành lang tuyến từ cột 47 đến cột 50 NR Thọ Lợi (ĐZ 477E15.13)

- Lắp đặt bổ sung 02 LBS 24kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ; Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC

Trong đó đoạn tuyến đi qua xã Minh Châu cụ thể như sau:

I. Thuộc NR Diễn Thắng ĐZ ĐZ 479E15.13

- Điểm đầu: Cột 1 NR Diễn Thắng ĐZ 479E15.13
- Điểm cuối: Cột 28 NR Diễn Thắng ĐZ 479E15.13
- Vị trí lắp đặt TB đóng cắt LBS: Cột 1 NR Diễn Thắng ĐZ 479E15.13 (Thay mới)

II. Thuộc NR Diễn Thắng 4 ĐZ ĐZ 477E15.13

- Điểm đầu: Cột 28 NR Diễn Thắng ĐZ 479E15.13
- Điểm cuối: Cột 6 NR Diễn Thắng 4 ĐZ 479E15.13
- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 22kV hiện có chủ yếu đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc theo đường giao thông, đường nội đồng, một số đoạn tuyến vượt qua các đường giao thông thuộc địa phận xã Minh Châu, tỉnh Nghệ an. Khi tiến hành cải tạo đường dây, cần thay thế một số vị trí cột đã cũ, thấp hoặc thêm các vị trí xen giảm mới nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời thay thế một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ MINH CHÂU



Lê Mạnh Hiền

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU

VỰC DIỄN CHÂU



Nguyễn Văn Thắng

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐỀN BÙ DỰ KIẾN TRONG
PHẠM VI HÀNH LANG TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP**

Công trình: “Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV
Nghị Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh
Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026”

Hôm nay, ngày 06 tháng 2 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã An Châu:

- Ông (bà): Nguyễn Huỳnh Tịnh

Chức vụ: P. Chủ tịch

- Ông (bà):

Chức vụ:

2. Đại diện UBND xã Tân Châu:

- Ông (bà): Phan Văn Hùng

Chức vụ: P. Chủ tịch

- Ông (bà):

Chức vụ:

3. Đại diện UBND xã Minh Châu:

- Ông (bà): Lê Mạnh Hiên

Chức vụ: Chủ tịch

- Ông (bà):

Chức vụ:

4. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Diễn Châu - Công ty Điện lực Nghệ

An:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Đội Phó

- Ông (bà):

Chức vụ:

5. Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào

Chức vụ: P. Giám Đốc

- Ông (bà): Lê Văn Vượng

Chức vụ: ĐT Thiết kế

- Ông (bà):

Chức vụ:

Sau khi kiểm tra khảo sát thực tế tại hiện trường tại các tuyến đường dây trung thế
công trình: “Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghị Lộc,
Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu
quản lý năm 2026” thống nhất khối lượng đền bù dự kiến trong phạm vi hành lang tuyến
đường dây trung áp như sau:



KHỐI LƯỢNG ĐỀN BÙ

TT	HẠNG MỤC	Đơn vị	Khối lượng	Ghi chú
1	Đất chiếm dụng móng cột (đất ruộng)	m2	232	
2	Đền bù lúa trưởng thành (thi công móng chiếm dụng + tiếp địa)	m2	302	
3	Đền bù lúa trưởng thành (thi công kéo rải dây)	m2	5845	
4	Trích lục, chỉnh lý bản trích đo địa chính 100-300 m2	Thửa	30	
5	Trích lục, chỉnh lý bản trích đo địa chính >300-500 m2	Thửa	18	
6	Trích lục, chỉnh lý bản trích đo địa chính >500-1000 m2	Thửa	9	
7	Trích lục, chỉnh lý bản trích đo địa chính >1000-3000 m2	Thửa	3	

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ AN CHÂU



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huỳnh Trình

UBND XÃ TÂN CHÂU



Phan Văn Hùng

UBND XÃ MINH CHÂU



Lê Mạnh Hiên

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

DIỄN CHÂU



Nguyễn Văn Thưởng



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT VỊ TRÍ CÁC CỘT
THAY, DẮM MỚI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ**

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 28 tháng 1 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Lam Thành:

- Ông (bà): Nguyễn Cảnh Đức Chức vụ: P. Chủ tịch
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Hưng Nguyên - Công ty Điện lực

Nghệ An:

- Ông (bà): Nguyễn Minh Tuấn Chức vụ: Đội Phó
- Ông (bà): Chức vụ:

3. . Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P.Giám Đốc
- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: ĐT Thiết kế
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập thống nhất nội dung như sau:

Thay thế 01 Recloser 35kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ; Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC:

I. Thuộc ĐZ 377E15.1

- Thiết bị Recloser 35kV lắp đặt mới.

- Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt Recloser: Cột 24A ĐZ 477E15.1 (Dắm mới)
- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 35kV hiện có đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị, cầnắm mới vị trí cột 24A ĐZ 477E15.1 nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời làm mới một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ LAM THÀNH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Đức

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC

HÙNG NGUYỄN



Nguyễn Minh Tuấn

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT VỊ TRÍ CÁC CỘT
THAY, DẮM MỚI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ**

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 06 tháng 2 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Nam Đàn:

- Ông (bà): Nguyễn Văn Dương Chức vụ: P. Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Nam Đàn - Công ty Điện lực

Nghệ An:

- Ông (bà): Trần Lực Chức vụ: Đại phó
- Ông (bà): Chức vụ:

3. . Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P.Giám Đốc
- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: DT Thiết kế
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

Lắp đặt mới 01 Recloser 24kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ; Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC:

I. Thuộc ĐZ 475E15.15

- Thiết bị Recloser 24kV lắp đặt mới.

- Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt Recloser: Cột 05 T1 Nam Thanh 2 ĐZ 475E15.5
(Thay cột)

- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 22kV hiện có đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị, cần thay mới vị trí cột Cột 05 T1 Nam Thanh 2 ĐZ 475E15.5 nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời làm mới một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.



UBND XÃ NAM ĐÀN

Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Văn Dương

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU
VỰC NAM ĐÀN



Trần Lực
Trần Lực

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào
Lê Đức Đào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT VỊ TRÍ CÁC CỘT
THAY, DẪM MỚI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ**

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 26 tháng 1 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Đại Huệ:

- Ông (bà): Nguyễn Đình Thọ Chức vụ: P. Chủ tịch
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Nam Đàn - Công ty Điện lực

Nghệ An:

- Ông (bà): Tôn Lực Chức vụ: Đội Phó
- Ông (bà): Chức vụ:

3. . Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P. Giám Đốc
- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: DT Thiết kế
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

Điều chuyển 01 LBS 24kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) : Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC:

I. Thuộc ĐZ 475E15.15

- Thiết bị: LBS 24kV điều chuyển từ vị trí cột 05 T1 Nam Thanh 2 ĐZ 475E15.5.

- Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt LBS: Cột 57 Nam Thanh ĐZ 475E15.5 (Thay cột)

- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 22kV hiện có đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị, cần thay mới vị trí cột 57 Nam Thanh ĐZ 475E15.5 nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời làm mới một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.


UBND XÃ ĐẠI HUỆ
T.M. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Thế

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU
VỰC NAM ĐÀN



Trần Lực

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT VỊ TRÍ CÁC CỘT THAY, DẮM MỚI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 06 tháng 2 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Nam Đàn:

- Ông (bà): *Nguyễn Văn Dương* Chức vụ: *P. Chủ tịch UBND xã*
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Thanh Chương - Công ty Điện

lực Nghệ An:

- Ông (bà): *Điền Chí Phước* Chức vụ: *Đội phó*
- Ông (bà): Chức vụ:

3. . Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P.Giám Đốc
- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: ĐT Thiết kế
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

Lắp đặt mới 01 LBS 35kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ; Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC:

I. Thuộc ĐZ 375E15.5

- Thiết bị LBS 35kV lắp đặt mới.

- Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt LBS: Cột 39 ĐZ 375E15.5 (Thay cột)
- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 35kV hiện có đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị, cần thay mới vị trí cột 39 ĐZ 375E15.5 nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời làm mới một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.


UBND XÃ NAM ĐÀN

Nguyễn Văn Dương

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU
VỰC THANH CHƯƠNG



Trần Thế Phúc

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN THỎA THUẬN THỐNG NHẤT VỊ TRÍ CÁC CỘT
THAY, DẮM MỚI LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

Hôm nay, ngày 06 tháng 2 năm 2026, chúng tôi gồm:

1. Đại diện UBND xã Xuân Lâm:

- Ông (bà): Thăng Đức Trung Chức vụ: P. Chủ tịch UBND xã
- Ông (bà): Chức vụ:

2. Đại diện Đội quản lý Điện Lực khu vực Thanh Chương - Công ty Điện lực Nghệ An:

- Ông (bà): Điền Chí Phúc Chức vụ: Đội Phó
- Ông (bà): Chức vụ:

3. Đại diện đơn vị tư vấn – XN Dịch vụ Điện Lực Nghệ An:

- Ông (bà): Lê Đức Đào Chức vụ: P. Giám Đốc
- Ông (bà): Lê Văn Vượng Chức vụ: ĐT Thiết kế
- Ông (bà): Chức vụ:

Sau khi khảo sát thực địa đã xác định đoạn tuyến đường dây cải tạo và nâng cấp dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026" và căn cứ phương án đầu tư do Công ty Điện lực Nghệ An lập.

Lắp đặt mới 01 LBS 35kV. Bổ sung các thiết bị kết nối (modem APN) ; Xây dựng kênh truyền 4G/APN để kết nối về TTĐKX và về TTGSDL của Tổng công ty và TTĐKX của PC:

I. Thuộc ĐZ 374E15.11

- Thiết bị LBS 35kV lắp đặt mới.

- Vị trí lắp đặt thiết bị đóng cắt LBS: Cột 170A ĐZ 374E15.11 (Thay cột)

- Giải pháp kỹ thuật: Tuyến đường dây trên không 35kV hiện có đi trên ruộng lúa, hoa màu dọc. Khi tiến hành lắp đặt thiết bị, cần đảm mới vị trí cột 170A ĐZ 374E15.11 nhằm mục đích giảm khoảng cách giữa các cột đồng thời làm mới một số xà, sứ, phụ kiện... đảm bảo kết cấu vận hành an toàn lâu dài.

(Có mặt bằng thỏa thuận chi tiết kèm theo)

Các bên cùng thống nhất nội dung và ký vào biên bản để làm cơ sở cho việc thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

UBND XÃ XUÂN LÂM



HOÀNG ĐỨC TRUNG

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU
VỰC THANH CHƯƠNG



Trần Thế Phúc

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào




PHỞ CHỦ TỊCH
Nguyen Huân Sơn

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC


DIỄN CHÂU



XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

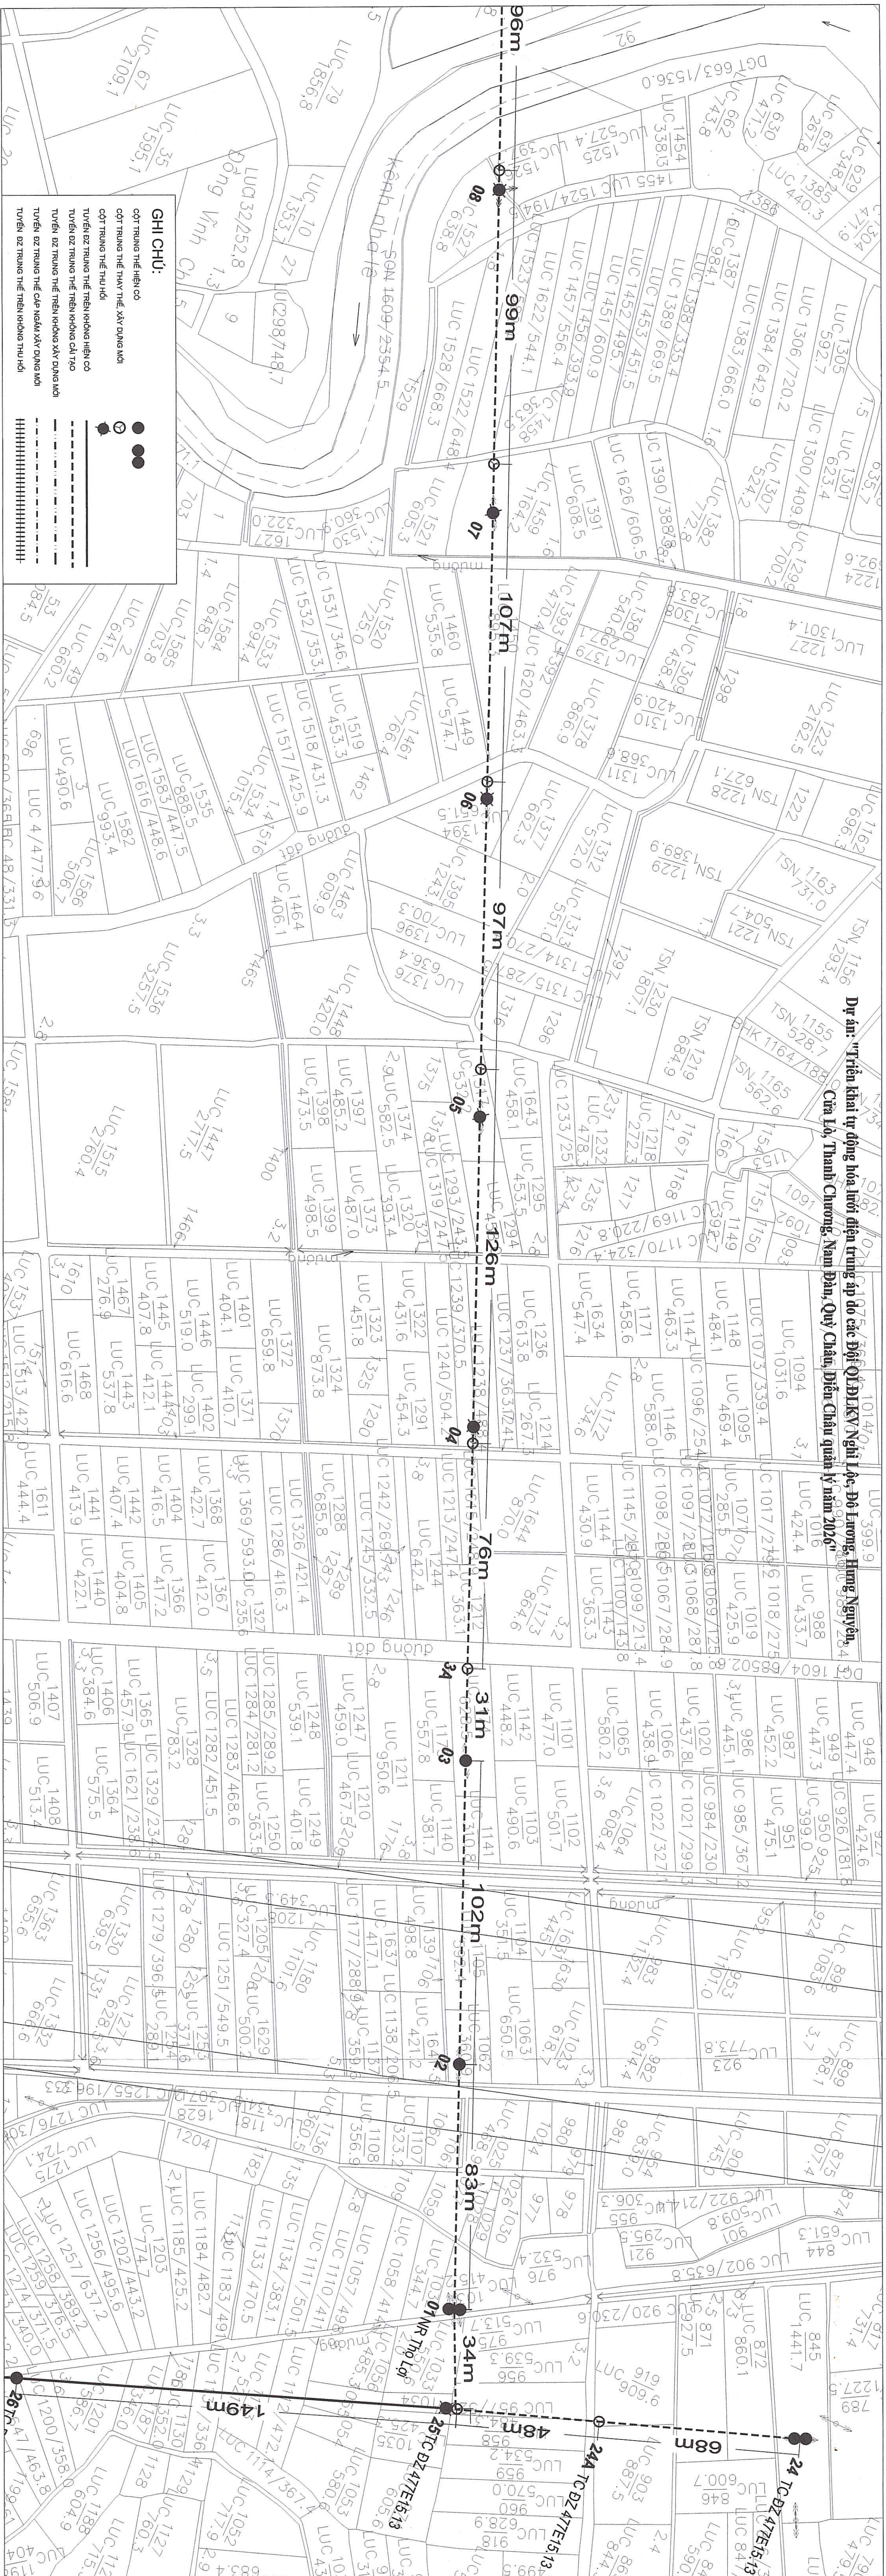

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên,
Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"



PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Đức

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC
HƯNG NGUYÊN



Nguyễn Minh Tuấn

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào


GHI CHÚ:

CỘT TRUNG THỂ HIỆN CÓ

CỘT TRUNG THỂ THAY THẾ, XÂY DỰNG MỚI

CỘT TRUNG THỂ THU HỒI

TUYẾN ĐZ TRUNG THỂ TRÊN KHÔNG HIỆN CÓ



Vị trí: Cột 24A Nr Hưng Phúc ĐZ 377E15.1 (Dầm cột)
LBS 35kV

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên,
Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

UBND XÃ NAM ĐÀN



Nguyễn Văn Dương

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC
NAM ĐÀN




Trần Lực

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào



06
T1 Nam Thanh 2
ĐZ 475E15.15

05
T1 Nam Thanh 2
ĐZ 475E15.15

4A
T1 Nam Thanh 2
ĐZ 475E15.15

Vị trí: Cột 170A TC374E15.11 (Dắm mới)
LBS 35kV

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên,
Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

UBND XÃ NAM ĐÀN


Nguyễn Văn Dương

ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC
THANH CHƯƠNG


Trần Thế Phúc

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN


Lê Đức Đào

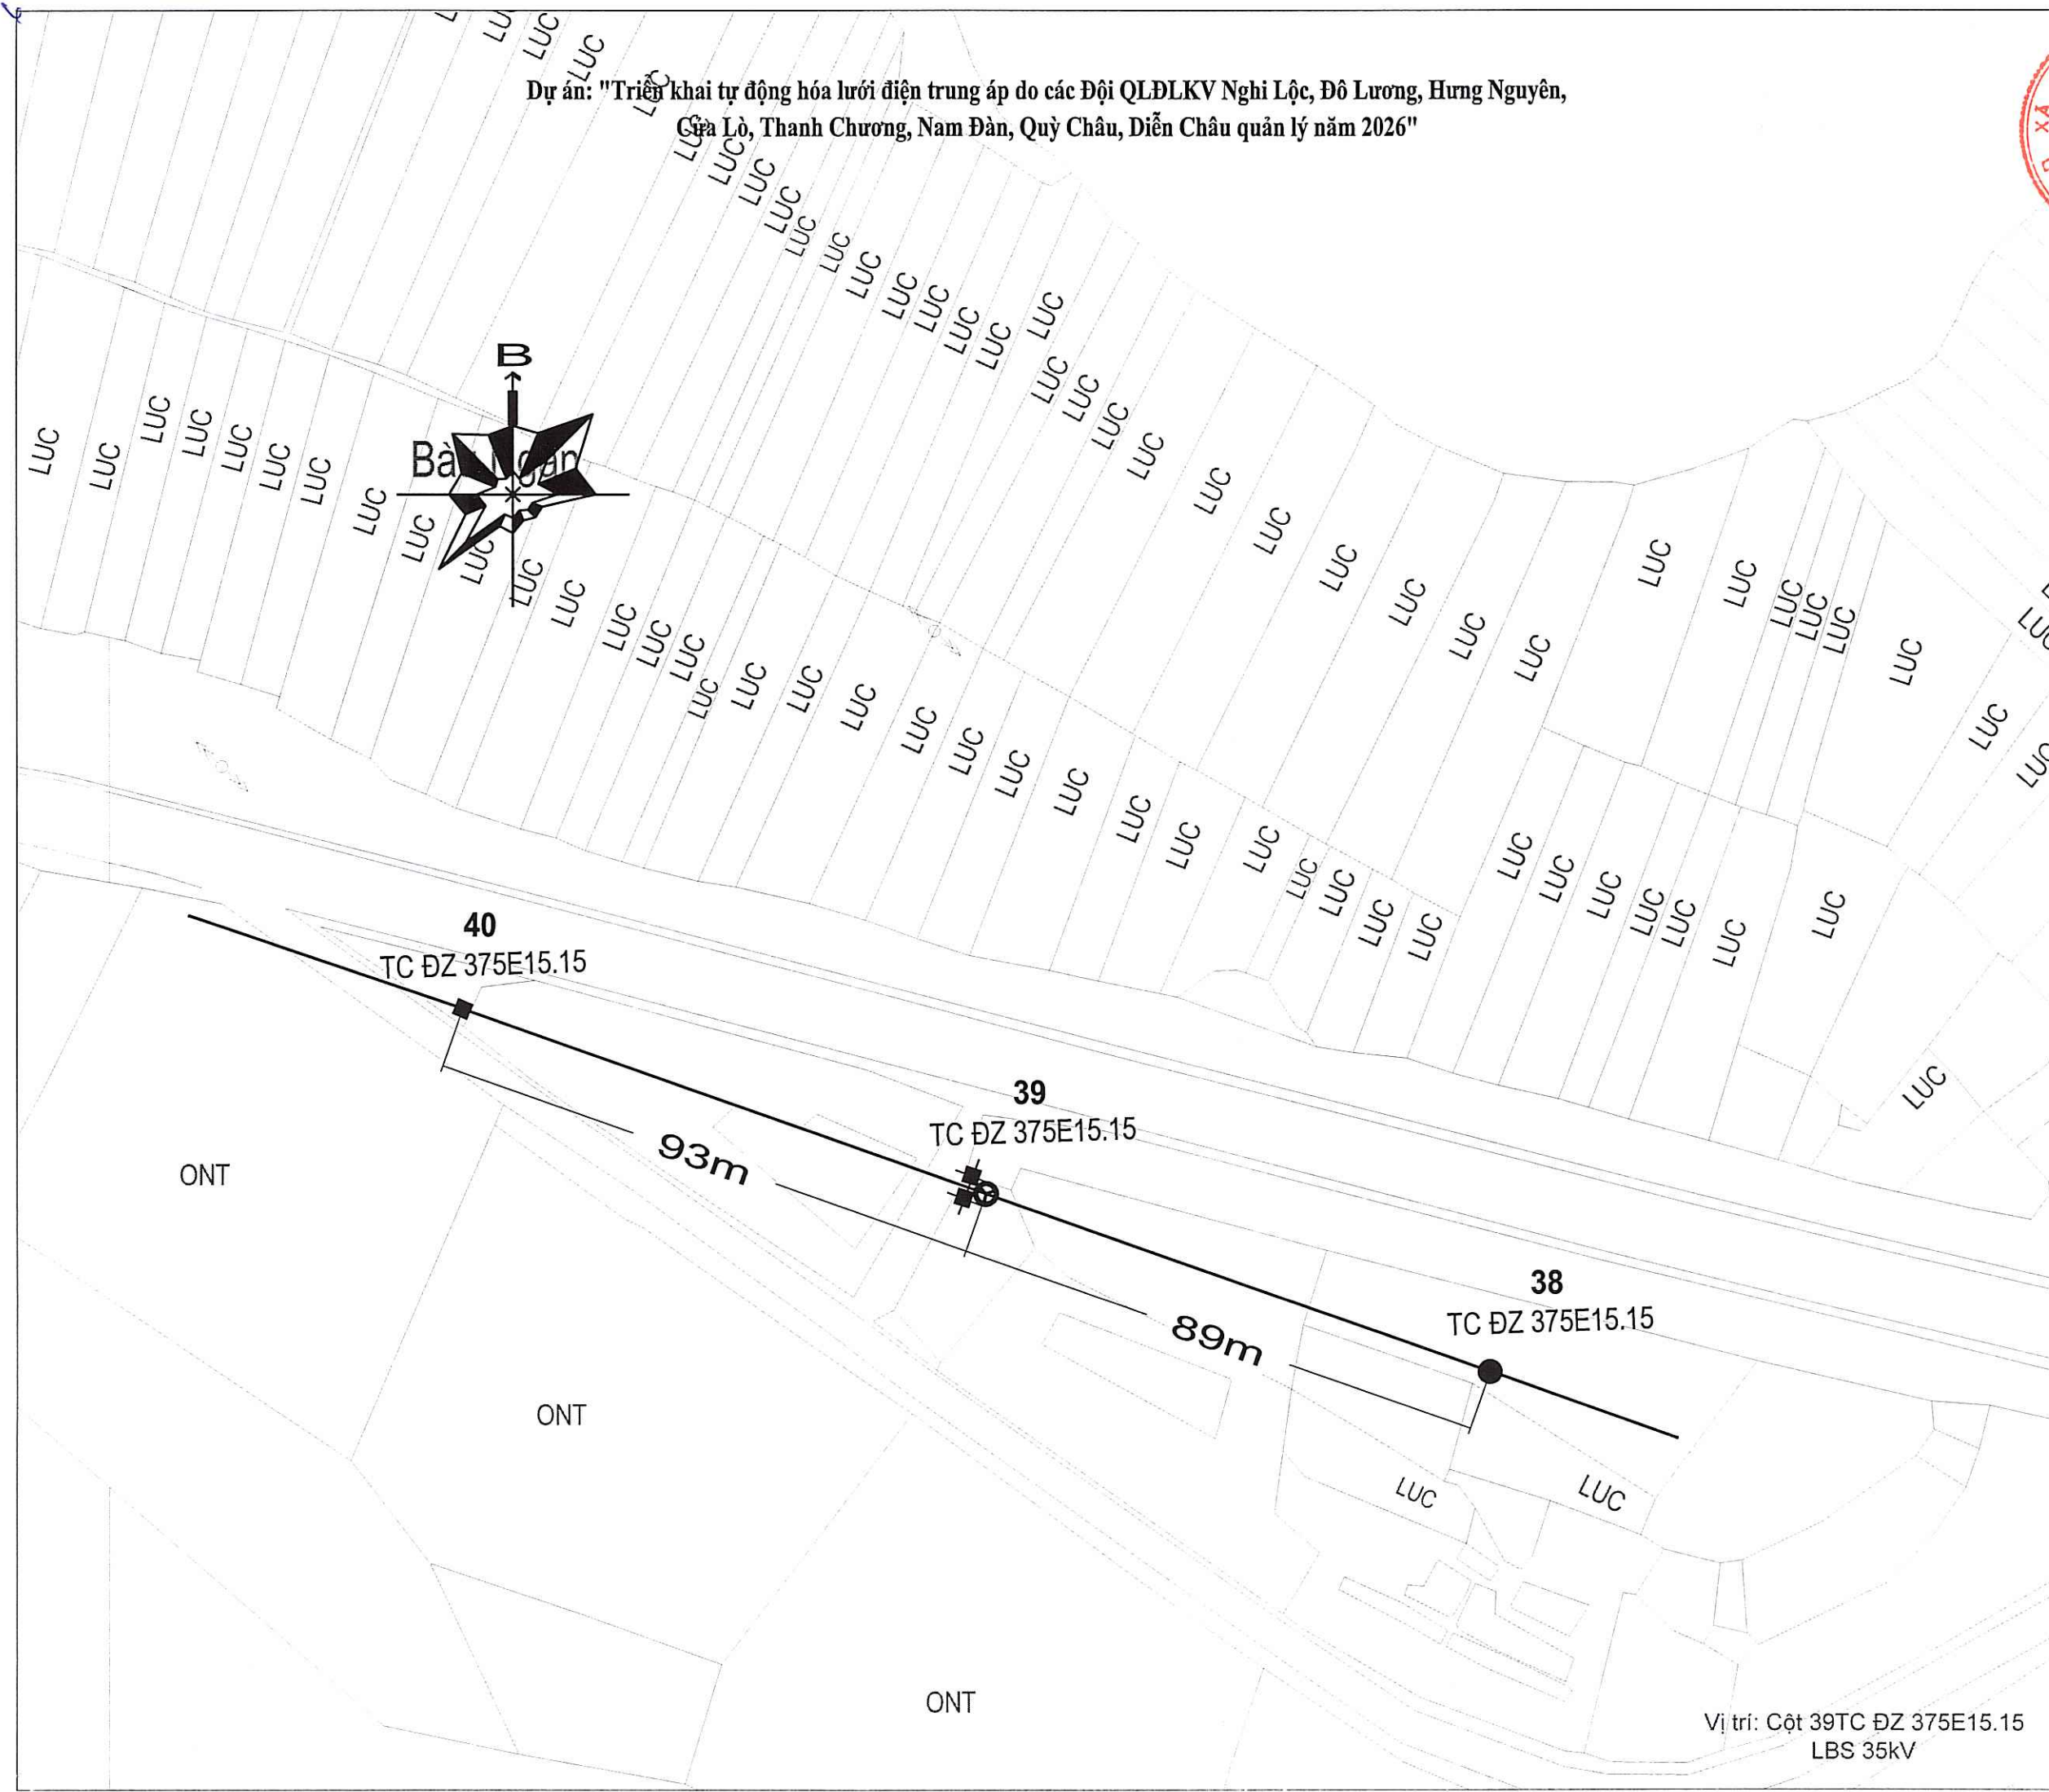

Vị trí: Cột 39TC ĐZ 375E15.15
LBS 35kV

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"


01
T3 Nam Xuân
ĐZ 475E15.15

108m

57
Nam Thanh
TC ĐZ 475E15.15

116m

59
TC ĐZ 475E15.15



Vị trí: Cột 57TC Nam Thanh ĐZ 375E15.15
LBS 24kV
(Điều chuyển từ cột 5 T1 Nam Thanh 2 ĐZ 475E15.15)

UBND XÃ ĐẠI HUỆ



ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC
NAM ĐÀN



Trần Lực

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

Dự án: "Triển khai tự động hóa lưới điện trung áp do các Đội QLĐLKV Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Cửa Lò, Thanh Chương, Nam Đàn, Quỳnh Châu, Diễn Châu quản lý năm 2026"

UBND XÃ XUÂN LÂM



ĐỘI QUẢN LÝ ĐIỆN LỰC KHU VỰC THANH CHƯƠNG



Trần Thế Phúc

XN DV ĐIỆN LỰC NGHỆ AN



Lê Đức Đào

Vị trí: Cột 78 TC ĐZ 480E15.1 (Thay cột) LBS 24kV
